

CSD

INFORME



Comisión Sectorial de Descentralización

Informe Avance de Gestión Municipal al 31 de mayo de 2024

FONDO DE INCENTIVO PARA LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Agosto 2024



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO
DE INTENDENTES**



Informe Avance de Gestión Municipal - Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios

Al 31 de mayo de 2024

Contenido

Informe Avance de Gestión Municipal - Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	3
Presentación	4
Avance de ejecución por Departamento, Municipio, Proyecto.....	5
Anexo - Síntesis del avance de los proyectos informados.....	¡Error! Marcador no definido.

Presentación

Este informe tiene como objetivo resumir los avances en la gestión municipal hasta el 31 de mayo de 2024. Su propósito es presentar esta información a la Comisión Sectorial de Descentralización.

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento de gestión administrativa para el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, los municipios presentan informes cuatrimestrales sobre el progreso de los proyectos a lo largo del año. Esto facilita el monitoreo y seguimiento de los proyectos. El informe actual corresponde al primer reporte de avance cuatrimestral del año 2024 y fue presentado en el Sistema de Gestión Municipal (SGM).

Estos informes son esenciales ya que proporcionan una visión integral del estado actual de los proyectos municipales. El Concejo Municipal puede utilizar este análisis para tomar decisiones y avanzar en la implementación, accediendo a los fondos disponibles del año.

Este informe abarca un periodo extendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 con el objetivo de incluir información sobre los proyectos en curso y aquellos que quedaron pendientes de finalización de años anteriores. Los Concejos Municipales ingresan la información al SGM y los informes cuentan con la aprobación del Concejo Municipal, con la firma del alcalde/sa y al menos dos concejales.

La División Cohesión Social de la Dirección de Descentralización de OPP recibe, procesa y valida los informes. La validación técnica incluye verificar la documentación requerida, como la firma del alcalde/sa y al menos dos concejales. En el caso de proyectos finalizados, además se debe adjuntar el acta o resolución del Concejo Municipal que confirma el cierre de la ejecución, junto con el informe de cierre elaborado por el técnico responsable de las certificaciones.

Avance de ejecución por Departamento, Municipio, Proyecto

A partir del procesamiento de la información presentada por los municipios, y tal como se observa en la tabla siguiente, el 72% de los municipios (90) realizó una descripción del avance de cada proyecto y cumplió con los requerimientos establecidos para su validación mencionados anteriormente. Dos informes permanecen en estado pendiente de su validación y 33 municipios no han reportado sus avances para el periodo.

Tabla 1: Situación de Informes de avance

Estado de situación de informes al 31/12/2023	Cantidad de informes	%
No presentaron	33	26%
Pendientes de validación	2	2%
Validados	90	72%
Total	125	100%

Para este periodo, la información validada de los 90 municipios revela que se han reportado un total de 610 proyectos. De estos, 585 están financiados con los literales B, C y D, y se tomarán en consideración para este informe.

En el Informe de avance los municipios identifican el estado de situación de los proyectos incluidos en sus planificaciones, de acuerdo a un listado previamente cargado de estados de situación posibles. Estos estados son: En ejecución de acuerdo a lo previsto (el proyecto cumple con su ejecución de acuerdo a lo previsto en el cronograma y no presenta alteraciones); En ejecución con demoras (el proyecto ha sufrido algún tipo de desvío en su ejecución respecto al cronograma previsto); Detenido o en suspenso (el proyecto ha detenido o suspendido su ejecución como resultado de la no ejecución de actividades programadas); y Proyectos finalizados (proyectos que han cumplido su ejecución y metas previstas).

En este marco, el estado de los 585 proyectos reportados de informes validados y cuyo financiamiento corresponde a los literales B, C y D es el siguiente:

- **Ejecución de acuerdo a lo previsto (56%):** La mayoría de los proyectos se encuentra en esta categoría, en correlación con el periodo temporal del Informe.
- **Ejecución con demoras (14%):** Se han identificado 80 proyectos con retrasos significativos en su ejecución, en comparación con la planificación inicial.
- **Detenido o en suspenso (7%):** Se reportan 40 proyectos de 27 municipios en esta situación. El motivo principal está relacionado con la disponibilidad de mano de obra para

iniciar su ejecución.

- **Proyectos finalizados (24%):** La mayoría de los proyectos reportados como finalizados corresponden a años anteriores (123). Solamente 16 proyectos del año 2024 se informan como finalizados, habiendo cumplido sus objetivos.

El análisis de los estados de situación reportados proporciona una visión general del grado de avance de la cartera de proyectos municipales financiados por el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal al 31 de mayo de 2024. En concordancia con el primer informe de avance del año, más de la mitad de los proyectos reportados de informes validados se encuentra en ejecución según lo planificado (56%), mientras que una proporción marginal de los proyectos informados (7%) aún no ha iniciado su ejecución debido a la disponibilidad de mano de obra. Cabe mencionar, que un 88% de los proyectos informados como finalizados corresponden a proyectos pendientes de cierre de años anteriores.

Gráfico 2. Estado de situación de proyectos reportados al 31/05/2024 en informes validados (%)


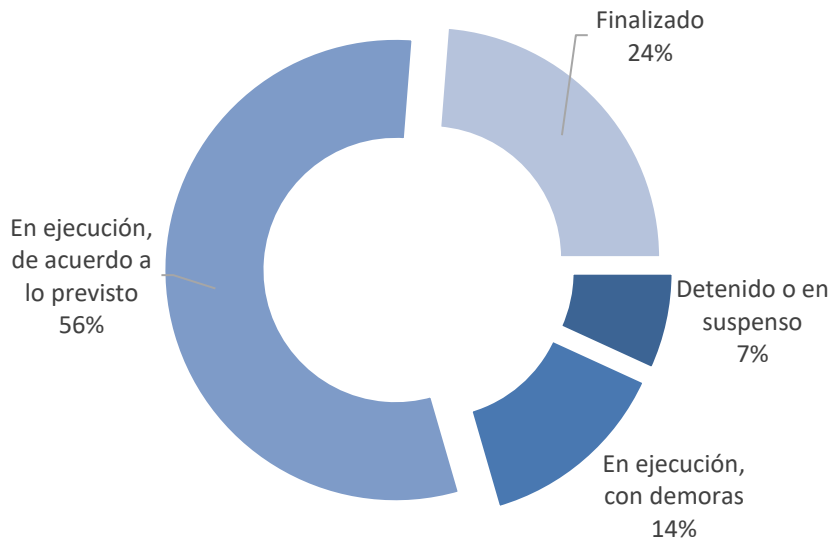


Gráfico 3. Cantidad de proyectos por estado y año reportados al 31/05/2024

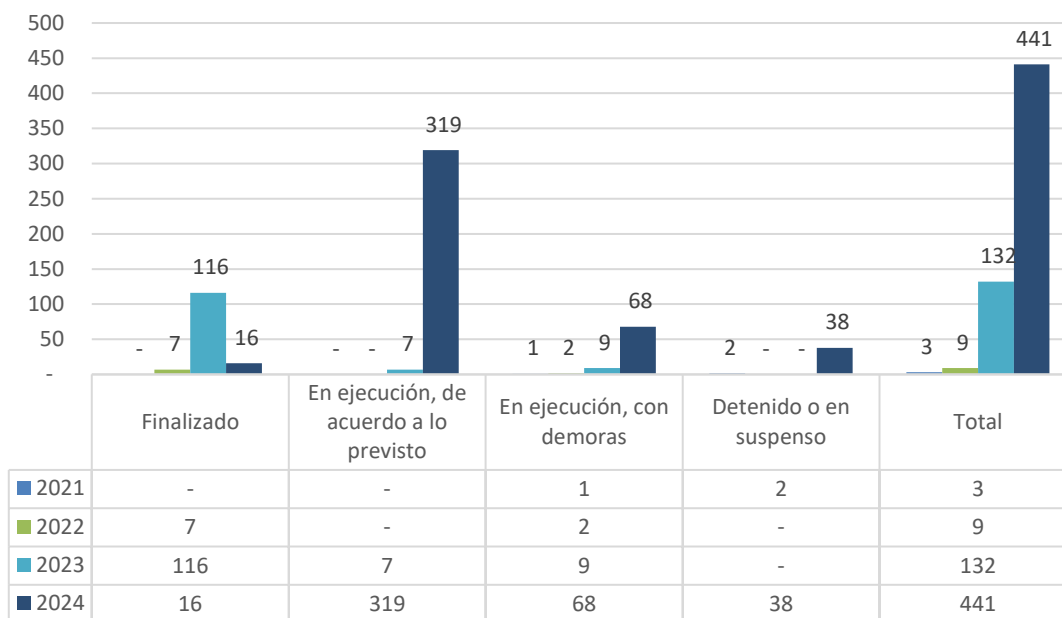

Fuente: 90 Informes de Avance de Gestión Municipal presentados y validados en el Sistema de Gestión Municipal (N=585 proyectos financiados con los literales B, C y D)

En este informe, se advierte que un cuarto de los proyectos reportados (25%) corresponde a años anteriores (2021 2022 y 2023). De estos, la mayoría (123) ha finalizado sus obras y/o acciones pendientes, mientras que 21 proyectos de 15 municipios aún permanecen en ejecución, próximos al cierre según lo informado. Los retrasos experimentados se deben principalmente a la disponibilidad de mano de obra o maquinaria para culminar las actividades previstas.

En formato digital se adjunta un anexo que proporciona un resumen conciso del avance de los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) financiados por los literales B, C y D del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal. El informe en formato digital estará disponible en el sitio web Municipios Uruguay. Este resumen está organizado por departamento y municipio, y se basa en la información reportada por los Concejos Municipales hasta el 31 de mayo de 2024.

Departamento: ARTIGAS

Departamento	Municipio	ID/Nombre Proyecto	Tipo de gasto	Proyecto estado	Proyecto presupuesto planificado	Proyecto % avance de certificado	
Artigas	BALTASAR BRUM	FIGM2023/1410 Reforma Galpón del Norte	Inversión	En ejecución, con demoras	3193976	100	
		FIGM2023/1606 Iluminación cancha de baby fútbol de Sportivo Mevir	Inversión	Finalizado	84610	100	
		FIGM2024/1531 Compra de maquinaria	Inversión	En ejecución, con demoras	4832044	17	
		FIGM2024/1532 Difusión a eventos deportivos y culturales	Funcionamiento	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	330000	73	
		FIGM2024/1533 Pista Pumptrack-Skate	Inversión	Detenido o en suspenso	887400	0	
		FIGM2024/1534 Paseo de los abuelos	Inversión	Detenido o en suspenso	2165760	0	
		FIGM2024/1535 Urbanización	Inversión	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	1073063	27	
		FIGM2024/1536 Imprevistos por obra Reforma Galpón del Norte	Inversión	En ejecución, con demoras	300000	4	
		FIGM2024/1537 Mobiliario para sala multiuso	Inversión	Finalizado	91000	100	
		BELLA UNIÓN	FIGM2024/1160 Dependencias Municipales Seguras	Funcionamiento	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	1107420	0
			FIGM2024/1161 Urbanización Centro Poblado Cainsa	Inversión	Detenido o en suspenso	9689931	0
			FIGM2024/1162 Urbanización Centro Poblado Mones Quintela	Inversión	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	6896660	0
			FIGM2024/1163 Gestión Vial 3	Inversión	Detenido o en suspenso	9161424	0
		TOMÁS GOMENSORO	FIGM2023/1005 urbanización	Inversión	Finalizado	2323522	100
			FIGM2023/1006 Futbol para todos	Funcionamiento	Finalizado	628808	100

FIGM2023/1612 Mejoramiento infraestructura Gimnasio	Inversión	Finalizado	1142471	100
FIGM2024/1164 YOGA TERAPÉUTICO	Funcionamiento	En ejecución, con demoras	79101	40
FIGM2024/1165 Adquisición de una barométrica.	Inversión	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	6479899	0
FIGM2024/1166 RENACER DEL FORTIN DE LOS GAUCHOS	Funcionamiento	En ejecución, con demoras	345335	0
FIGM2024/1167 Adecuar la Urbanización, mediante intervenciones puntuales en algunos barrios	Inversión	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	1171054	0
FIGM2024/1168 FÚTBOL PARA TODOS	Funcionamiento	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	593269	35
FIGM2024/1169 DIVIERTETE APRENDIENDO MÚSICA	Funcionamiento	Detenido o en suspenso	237304	0
FIGM2024/1170 ARTE EN MOVIMIENTO	Funcionamiento	Detenido o en suspenso	276855	0
FIGM2024/1172 Mejorar la iluminación y aspecto de los rincones infantiles de nuestras plazas	Funcionamiento	Detenido o en suspenso	81561	0
